PARTIAL BOUNDARY SURVEYS
FT. GIBSON LAKE
OKLAHOMA

Performed Under Contract Number DACW 56-85-C-0127

NW. 4 SEC. 6, T. 16-N, R. 20-E, COUNTY CHEROKEE

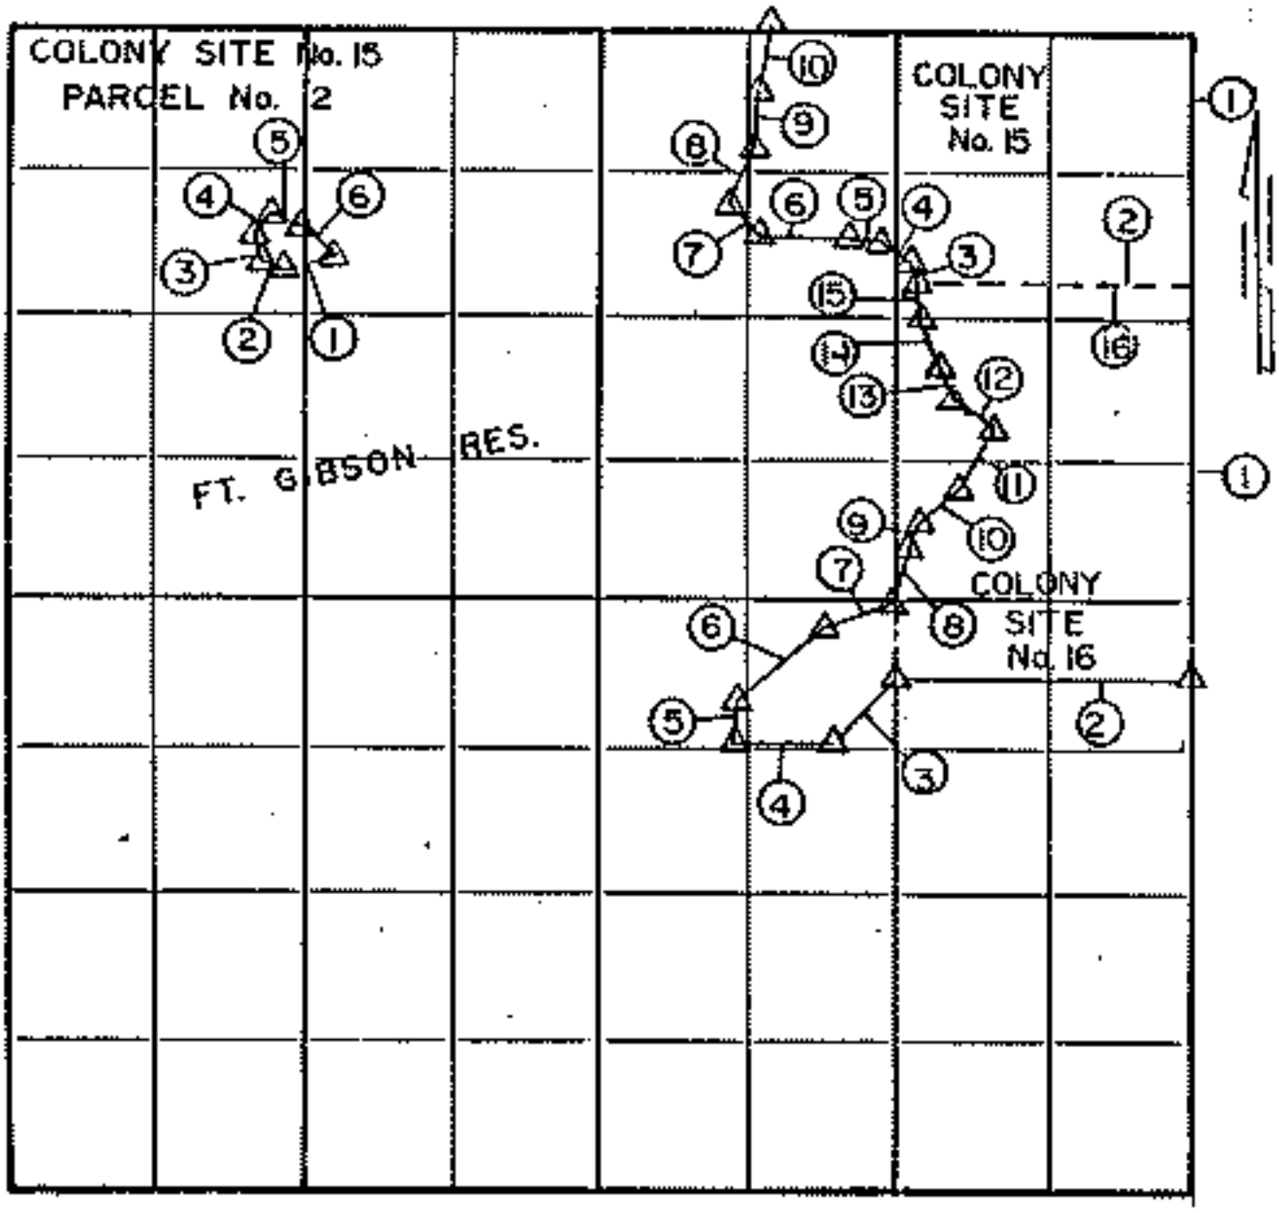

Course No.	Distance	Bearing
COLONY	SITE	No. 16
1	928.00	S 00° 16' E
2	666.20	N 89° 35' W
3	200.00	S 45° 25' W
4	223.00	S 89° 16' 20" W
5	95.00	N 04° 10' 20" E
6	263.70	N 48° 52' 20" E
7	147.60	N 70° 48' 05" E
8	134.20	N 18° 52' 05" E
9	65.20	N 19° 43' 50" E
10	122.70	N 46° 23' 50" E
11	150.20	N 30° 39' 10" E
12	114.90	N 54° 12' 50" W
13	79.60	N 22° 26' 50" W
14	115.40	N 16° 09' 50" W
15	92.90	N 12° 39' 50" W
16	618.30	S 89° 54' E
CON'T	SHEET	2

CERTIFICATE OF SURVEY
I hereby certify that the above [illegible] is a true and correct representation of the survey made on Sheet 6, [illegible]

BASIL E. SCOTT, JR.

Field Book No. 6-2010 Date 12-12-85

SCOTT & ASSOCIATES, INC.
Engineering & Surveying
For
U.S. ARMY ENGINEER DISTRICT, TULSA
CORPS OF ENGINEERS

SHEET 1 of 4

△ MONUMENT
□ ORIGINAL CORNER
○ IRON PIN

MYLAR II
