PARTIAL BOUNDARY SURVEYS

FT. GIBSON LAKE

OKLAHOMA

Performed Under Contract Number DACW 56-85-C-0127

NE/4 SEC. 17, T. 17N, R. 19E, COUNTY WAGONER

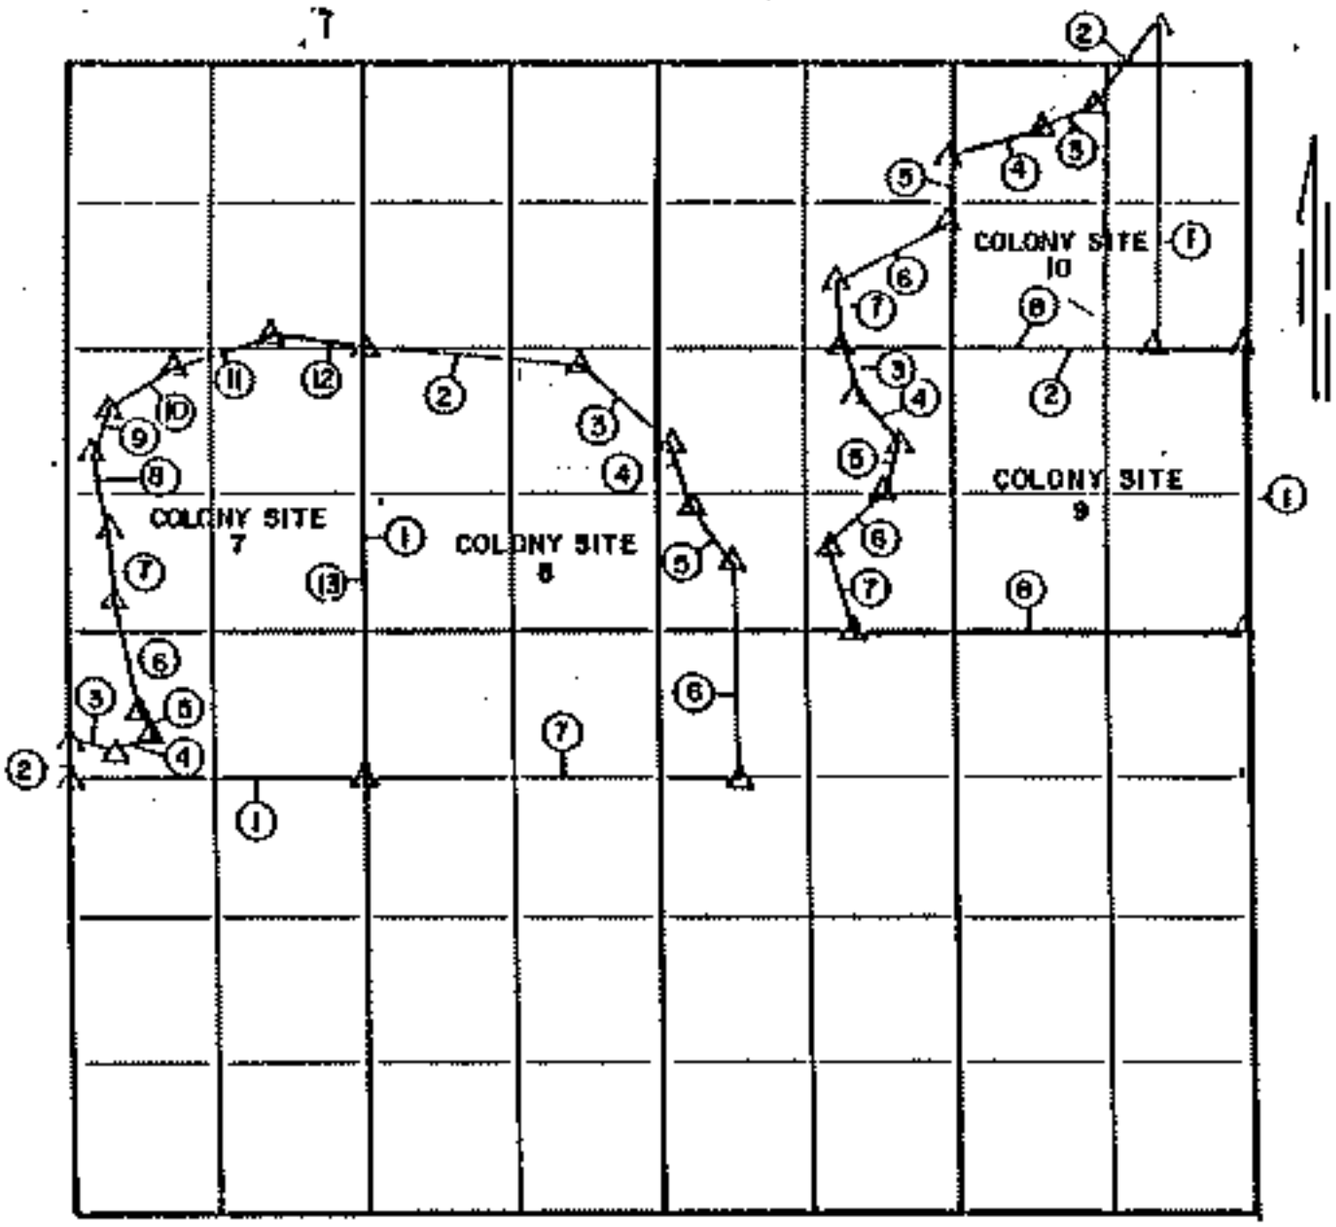

Course No.	Distance	Bearing	Course No.	Distance	Bearing
COLONY	SITE 9		COLONY	SITE	10
1	661.20'	NORTH	1	748.50'	NORTH
2	903.83'	N 89°45' W	2	208.55'	S 36°57' W
3	106.26'	S 18°52' E	3	144.50'	S 60°58' W
4	141.74'	S 42°41' E	4	204.55'	S 71°17' W
5	93.50'	S 10°31' W	5	146.40'	S 00°28' W
6	176.28'	S 41°34' W	6	285.50'	S 59°37' W
7	239.30'	S 11°47' E	7	153.75'	S 03°38' W
8	857.60'	EAST	8	703.83'	S 89°45' E

CERTIFICATE OF SURVEY

Field Book No. S-2009 Date 10-21-85

SCOTT & ASSOCIATES, INC.
Engineering & Surveying
For
U.S. ARMY ENGINEER DISTRICT, TULSA
CORPS OF ENGINEERS

SHEET 2 of 2

△ MONUMENT
□ ORIGINAL CORNER
○ IRON PIN
