PARTIAL BOUNDARY SURVEYS
FT. GIBSON LAKE
OKLAHOMA

Performed Under Contract Number DACW 56-85-C-0127

SE 4 SEC. 36, T. 17-N, R. 19-E, COUNTY CHEROKEE

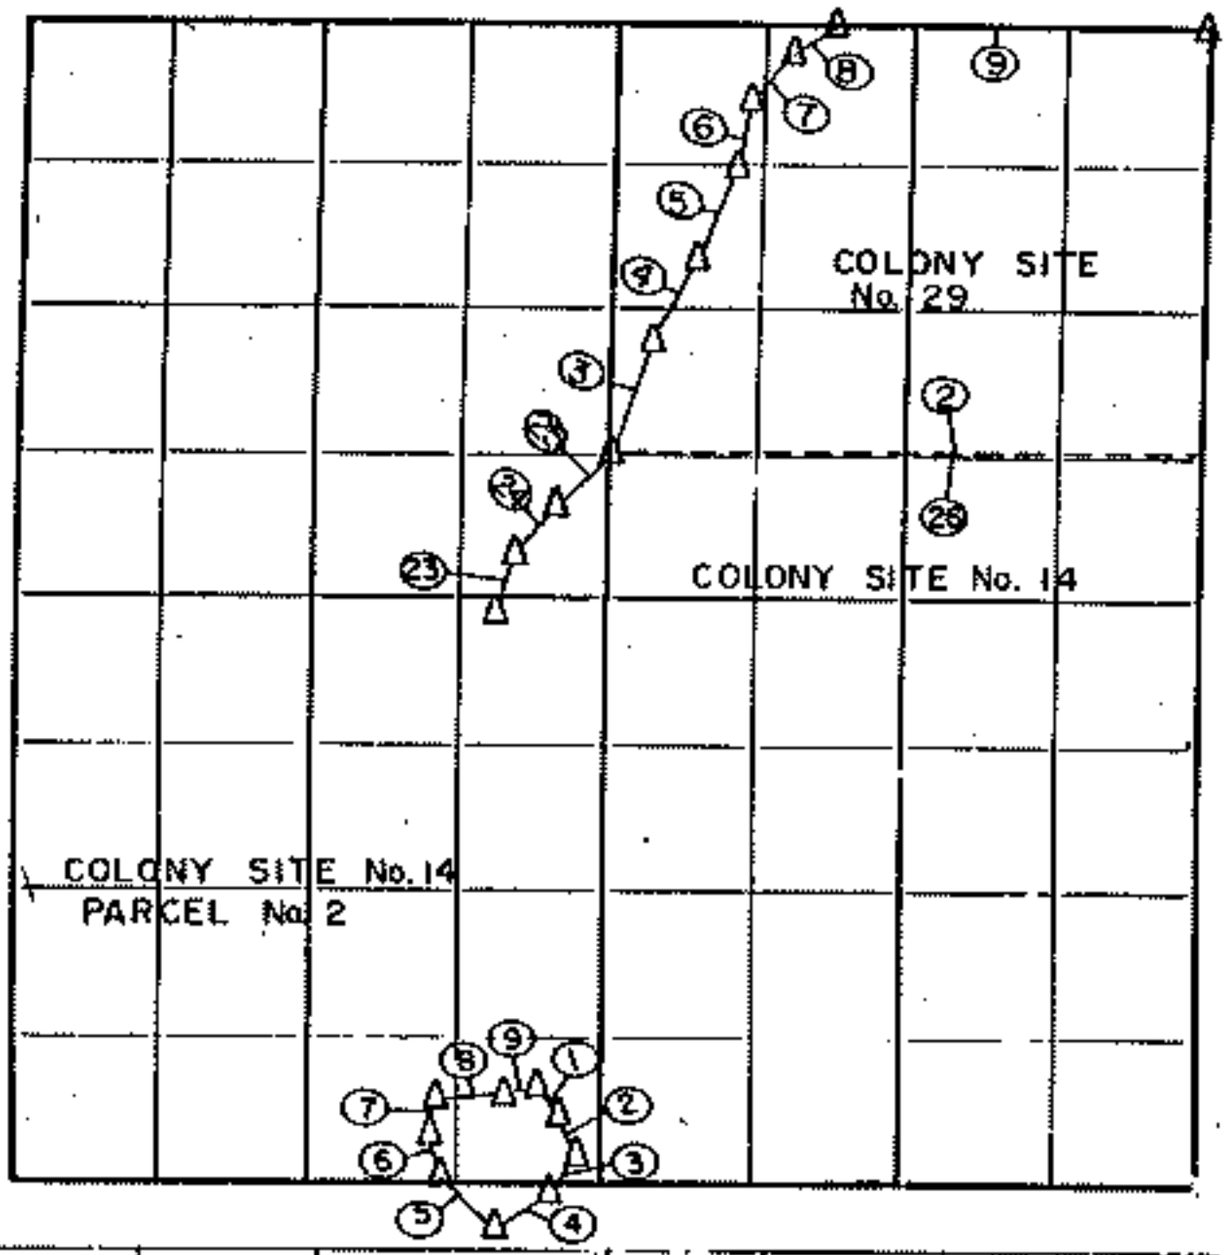

Course No.	Distance	Bearing
COLONY	SITE No.	14
24	129.40	N 43° 56' 40" E
25	173.60	N 36° 35' E
26	1280.60	N 89° 47' E
COLONY	SITE No.	29
3	265.10	N 17° 02' E
4	220.85	N 27° 52' E
5	210.30	N 22° 41' E
6	154.90	N 10° 45' 30" E
7	141.00	N 21° 33' 30" E
8	115.80	N 46° 54' 30" E
9	841.50	N 88° 19' 30" E

Course No.	Distance	Bearing
COLONY	SITE	No. 14
PARCEL	No. 2	
1	77.50	S 31° 55' 45" E
2	101.30	S 24° 59' 55" E
3	105.20	S 36° 20' 56" W
4	144.45	S 54° 50' 16" W
5	172.00	N 42° 51' 34" W
6	92.80	N 16° 52' 04" W
7	74.45	N 15° 06' 56" E
8	149.65	N 81° 32' 56" E
9	76.30	N 76° 45' E

CERTIFICATE OF SURVEY
I hereby certify that the above [illegible] Made Of Sec. [illegible]
BASIL E. SCOTT, JR.

Field Book No. 5-2010 Date 12-16-85

SCOTT & ASSOCIATES, INC.
Engineering & Surveying
For
U.S. ARMY ENGINEER DISTRICT, TULSA
CORPS OF ENGINEERS

△ MONUMENT
□ ORIGINAL CORNER
○ IRON PIN
