PARTIAL BOUNDARY SURVEYS
LOCK AND DAM NO. 16, WEBBERS FALLS,
ARKANSAS RIVER, OKLAHOMA

Performed Under Contract Number DACW 56-67-C-0035

SEC. 16 T 13 N, R 19 E COUNTY, MUSKOGEE

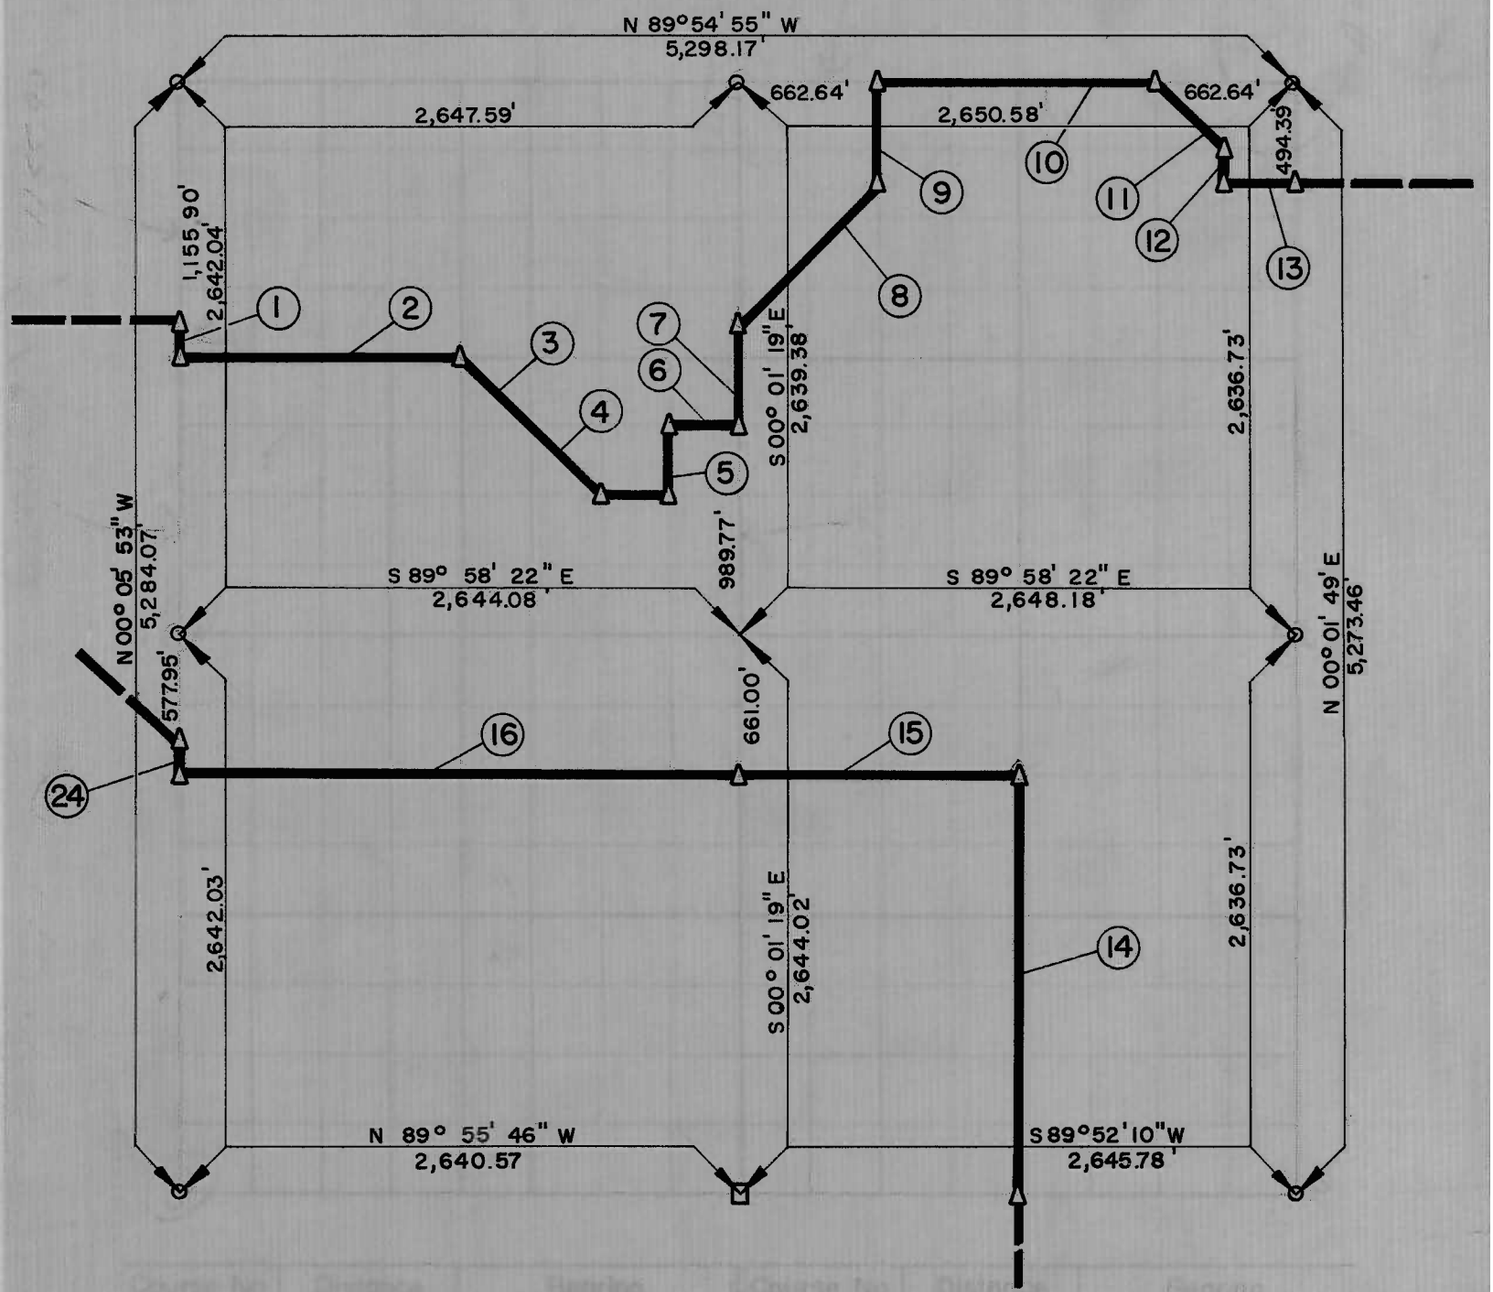

Course No.	Distance	Bearing	Course No.	Distance	Bearing
1	165.12	S 00°05' 53" E	14	1,980.28	N 00°00' 15" E
2	1,322.91	S 89°56' 37" E	15	1,323.79	S 89°59' 15" W
3	935.21	S 45°03' 18" E	16	2,643.20	N 89°57' 43" W
4	330.62	S 89°57' 30" E	24	82.56	N 00°05' 53" W
5	329.96	N 00°01' 53" W			
6	330.68	S 89°57' 12" E			
7	494.88	N 00°01' 19" W			
8	934.28	N 45°08' 34" E			
9	494.77	N 00°00' 33" W			
10	1,325.29	S 89°54' 55" E			
11	467.62	S 45°05' 27" E			
12	164.82	S 00°01' 15" W			
13	331.27	S 89°55' 38" E			

Should be 82.50

A-2549 SEPTEMBER, 1966

16 13 19 MUSKOGEE

John A. Whipple

BREISCH ENGINEERING CO. INC.

Under the Supervision of

U.S. ARMY ENGINEER DISTRICT, TULSA
CORPS OF ENGINEERS
