PARTIAL BOUNDARY SURVEYS
LOCK AND DAM NO. 16, WEBBERS FALLS,
ARKANSAS RIVER, OKLAHOMA

Performed Under Contract Number DACW 56-67-C-0035

SEC 27 T 13 N R 20 E COUNTY: MUSKOGEE

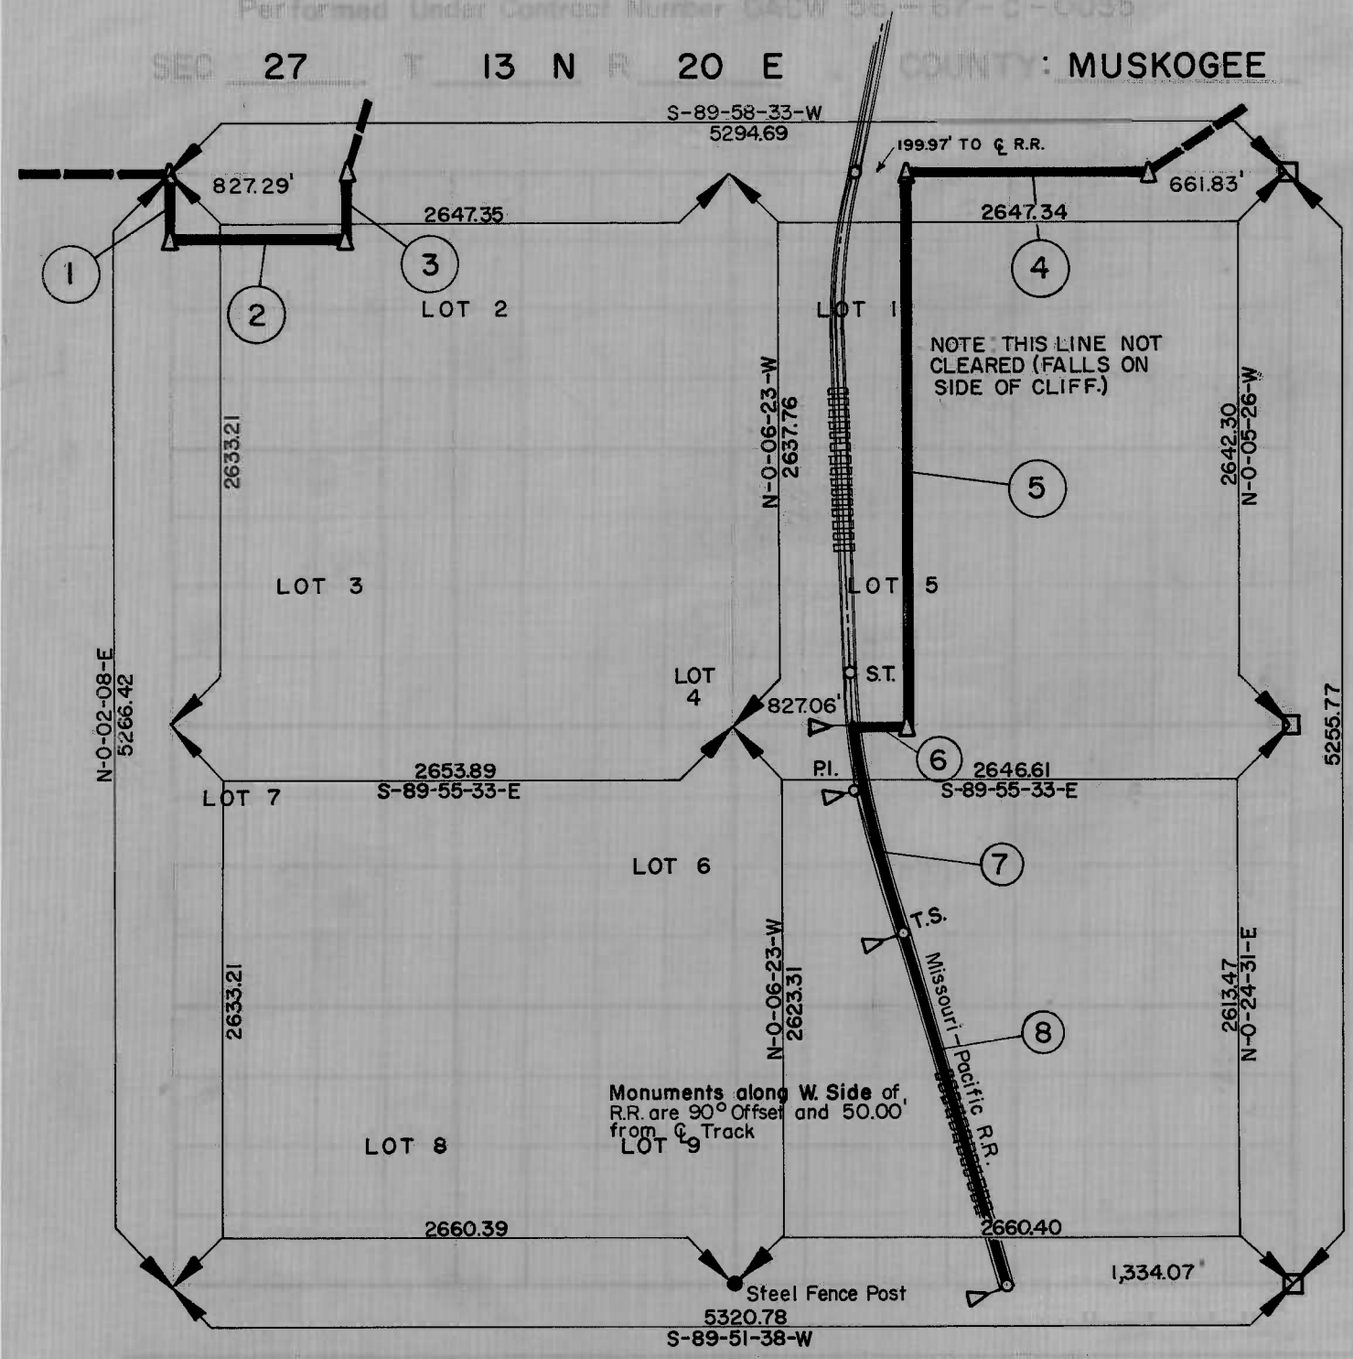

Course No.	Distance	Bearing	Course No.	Distance	Bearing
1	329.15	N-00-02-08-E			
2	827.55	S-89-59-17-W			
3	329.33	S-00-00-31-E			
4	1158.22	S-89-58-33-W			
5	2637.76	S-00-06-23-E			
6	186.38	N-89-55-33-W			
7	239.35	℄ Track at External - Curve: I=14°06'31" Lt., D=1°06', R=5,208.79', C.L.=1,108.40'			
11	536.93	℄ Track at S.C. " " " " "			
11	215.38	T.S. Spiral Curve Lt., Total Deflection=0°40'00", Length=215.38'			
8	1,718.26	S 16-25-03 E			

Field Book No. A-2556, A-2557 A-2558 Date DECEMBER, 1966

BREISCH ENGINEERING CO. INC.

Under the Supervision of

U.S. ARMY ENGINEER DISTRICT, TULSA
CORPS OF ENGINEERS

27 13 20 MUSKOGEE

John A. Whipple
